POLLYRIDE

RÉALISÉ PAR POL, KYLLIAN , JULIEN ET ANOUAR

ÉQUIPE

PL

Pol LAMOTHE

Product Owner & Dev Team

Responsable Technique, Backend & Base de données

JP

Julien PITRE

Scrum Master & Dev Team

Responsable Frontend

KA

Kyllian ARNAUD

Dev Team

Co-Responsable Frontend

AE

Anouar EL KHATBI IMANI

Dev Team

Responsable Communication & Développeur

CONTEXTE DU PROJET

PROBLÈME À RÉSOUDRE :

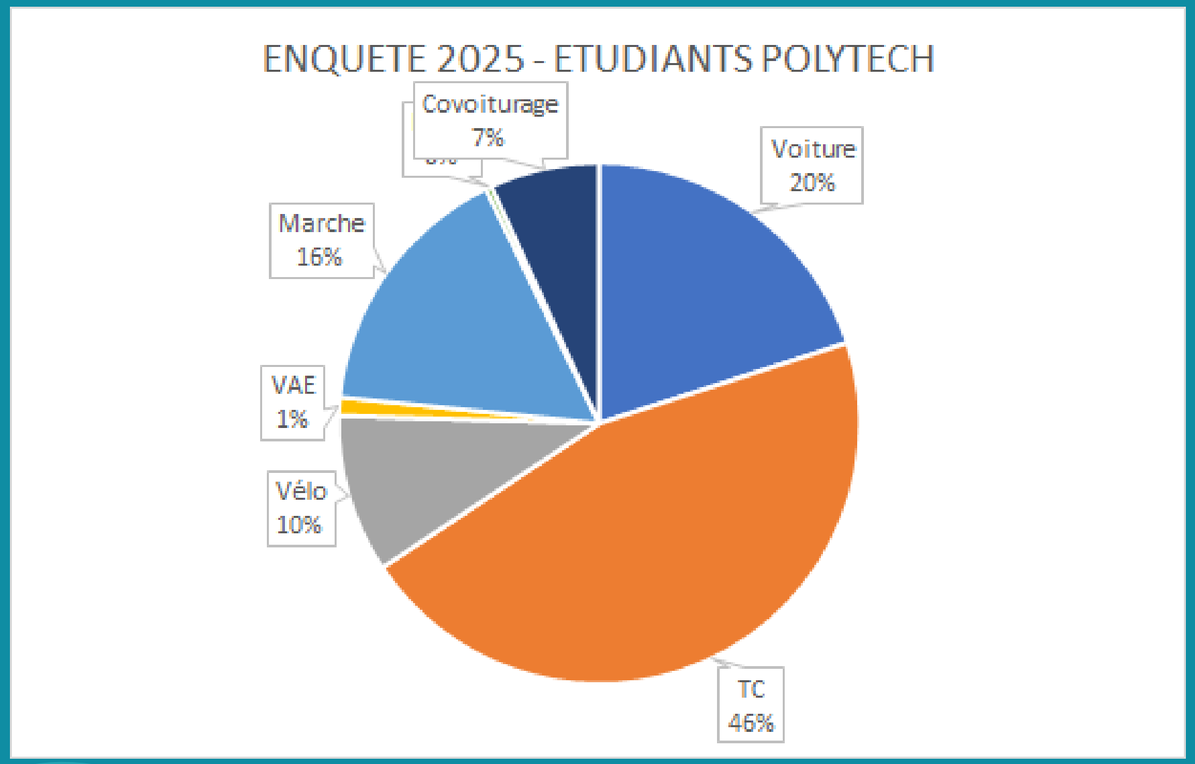

ÉCOLOGIE

ÉMISSION CO2 :

- POUR UNE VOITURE AVEC 1 PASSAGER : ~0,2 KG CO2KM/PERSONNE
- POUR UNE VOITURE AVEC 3 PASSAGER : ~0,07 KG CO_2E/KM/PERSONNE

APPLIQUÉ À POLYTECH NANTES, ÇA DONNE QUOI ?

SANS COVOITURAGE :
~144 TONNES DE CO2 PAR AN

AVEC COVOITURAGE :
JUSQU'A 96 TONNES DE CO2 ÉCONOMISÉES

CONTEXTE DU PROJET

SOLUTIONS EXISTANTES

BLABLACAR DAILY, KAROS, ETC..

PROBLÈME :

EMPLOIS DU TEMPS INSTABLE

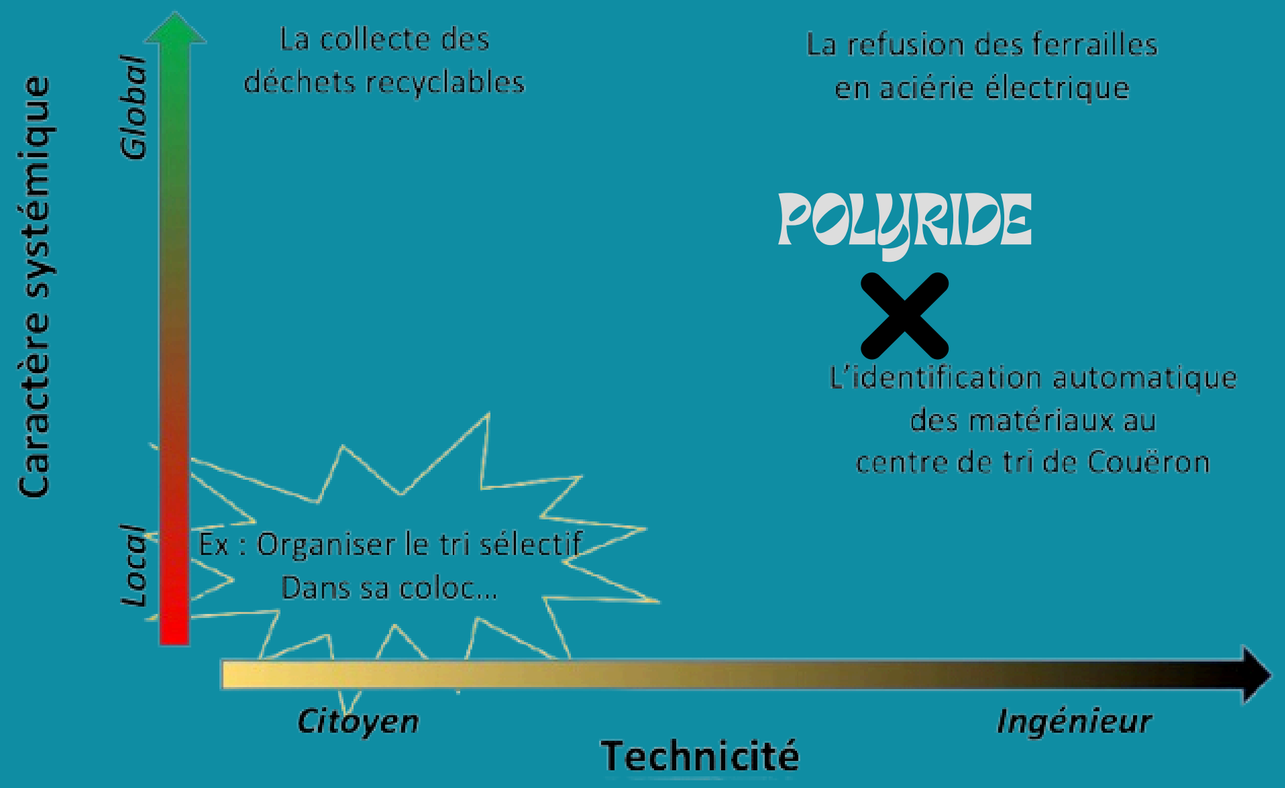

CONTEXTE DU PROJET

HISTOIRE SCRUM

- INITIALEMENT DÉSTINÉE DÉVELOPPEMENT LOGICIEL

CATACTÉRISTIQUE SCRUM

- INTÉRACTION CONSTANTE AVEC UN “CLIENT” (PO OU UTILISATEURS)
- TÂCHES CLAIREMENT DÉFINISSABLES ET CIBLÉES

OBJECTIFS SMARTEF

- SPÉCIFIQUE : DÉVELOPPER UNE PWA DE COVOITURAGE POUR ÉTUDIANTS AVEC MATCHING ALGORITHMIQUE.
- MESURABLE :
  - SITE DÉPLOYÉ ET ACCESSIBLE
  - UTILISATEURS POUVANT S'INSCRIRE ET RENSEIGNER LEURS INFORMATIONS
  - UTILISATEURS POUVANT TROUVER DES ÉTUDIANTS PROCHE ET AYANT LES MÊMES HORAIRES
  - UTILISATEURS POUVANT DEMANDER ET ACCEPTER/REFUSER DES TRAJETS
  - UN RÉEL TRAJET RÉALISÉ VIA L'APPLICATION
- ATTEIGNABLE : PÉRIMÈTRE JUGÉ ATTEIGNABLE PAR LE RESPONSABLE TECHNIQUE.
- RÉALISTE : RESPECT DE LA CONTRAINTE "COÛT 0€".
- TEMPORISÉ : PROJET DU 13/10/2025 AU 01/12/2025
- ÉCOLOGIQUE : RÉDUCTION DE L'ÉMISSION DE CO2 DES ÉTUDIANTS

1. FUN : UX MODERNE ET FLUIDE POUR ENGAGER LA COMMUNAUTÉ ÉTUDIANTE.

NOTE DE CADRAGE

Section	Description
Titre du Projet	PolyRide
Problème à résoudre / But / Besoin	Réduire l'empreinte carbone des déplacements étudiants vers le campus. Le covoiturage classique échoue sur ces trajets courts à cause de la rigidité et la variabilité des horaires étudiants. PolyRide lève ce frein par une mise en relation automatique (matching) basée sur la synchronisation des emplois du temps (via import ICS) et la proximité géographique.
Contexte	Projet de la matière "Gestion de projet écologique" de Polytech Nantes. Thématique "Transport/Mobilité" - "Locale et Citoyenne".

Objectifs (SMARTEF)	• Spécifique : Développer une PWA de covoiturage pour étudiants avec matching algorithmique (ICS + Géo).
	• Mesurable :
	  ◦ Site déployé et accessible
	  ◦ Utilisateurs pouvant s'inscrire et renseigner leurs informations
	  ◦ Utilisateurs pouvant trouver des étudiants proche et ayant les mêmes horaires
	  ◦ Utilisateurs pouvant demander et accepter/refuser des trajets
	  ◦ Un réel trajet réalisé via l'application
	• Atteignable : Périmètre jugé atteignable par le responsable Technique.
	• Réaliste : Respect de la contrainte "Coût 0€" (OpenSource, Hébergement sur infrastructure personnelle Raspberry Pi/VPS).
	• Temporisé : Projet du 13/10/2025 au 01/12/2025 (Deadline stricte).
	• Écologique : Réduction directe des GES
	• Fun : UX moderne et fluide pour engager la communauté étudiante.

Périmètre (Product Backlog)	Le projet couvre l'ensemble des processus de développement logiciel liée à la création de l'application
Acteurs / Équipe	• Pol LAMOTHE : Product Owner, Dev Team (Resp. Technique, Backend, DB). • Julien PITRE : Scrum Master, Dev Team (Resp. Frontend). • Kyllian ARNAUD : Dev Team (Co-Resp. Frontend). • Anouar EL KHATBI IMANI : Dev Team (Resp. Communication, Dev Frontend).
Contraintes	• Méthodologie : Agile (Scrum). • Deadline : 01/12/2025. • Coût : "Coût 0" (Hébergement sur matériel personnel). • Humain : Hétérogénéité des niveaux en dév Web. • Technique : Dépendance aux API externes (Nominatim, ENT). • Déploiement : Intégration des mise à jours directement sur le serveur de production.
Planning (Sprints)	• Sprint 1 (23/10 - 10/11) : Définitions du projet et création du socle technique • Sprint 2 (10/11 - 17/11) : Personnalisation des profils utilisateurs • Sprint 3 (17/11 - 24/11) : Proposition de trajets entre utilisateurs • Sprint 4 (24/11 - 01/12) : Déploiement du site en production et ouverture aux étudiants
Livrables	• TD1 (10 Nov.) : Dossier cadrage, Sprint planning. • TD3 (01 Déc.) : Produit final, Présentation (7 min), Rétrospective, Backlog, Burndown Chart.
Ressources utilisées	• Technologies : React, Node.js, MongoDB, Express, Nominatim. • Gestion : Outil de gestion de projet (JIRA ou similaire). • Infrastructure : Serveur personnel (Raspberry Pi ou VPS).

MATRiCE DE CRiTiCiTÉ

ID	Description du Risque	Probabilité (P)	Impact (I)	Criticité (P×I)	Niveau de Criticité	Actions d'atténuation
R1	**[Technique]** Défaillance de l'infrastructure d'hébergement personnelle (Raspberry Pi / VPS).	2 (Moyenne)	3 (Élevé)	6	**Élevée**	Préparer un plan de déploiement alternatif sur un service gratuit (ex: Vercel/Render) en cas d'échec du matériel personnel.
R2	**[Humain]** Manque d'expérience en développement Web de certains membres, entraînant des retards ou une qualité réduite.	3 (Élevée)	3 (Élevé)	9	**Critique**	Pair programming, revues de code systématiques par les membres seniors (Pol, Kyllian), priorisation stricte du MVP (P1, P2).
R3	**[Planning]** Non-respect de la deadline nale du 01/12/2025 pour la livraison du TD3.	2 (Moyenne)	4 (Critique)	8	**Critique**	Suivi rigoureux du Burndown Chart. Adaptation du périmètre (dé-prioriser P3) si la vélocité est insu sante.
R4	**[Dépendances]** Retard sur une tâche backend bloquante (ex: API Matching S2-BE-3) qui bloque l'équipe Frontend (ex: S2-FE-2).	2 (Moyenne)	3 (Élevé)	6	**Élevée**	Prioriser le développement des tâches backend bloquantes en début de sprint. Le Frontend travaille avec des données "mock" (ctives) en attendant l'API.
R5	**[Coût]** Dépassement de la contrainte "coût 0" (ex: besoin d'un service payant).	1 (Faible)	1 (Faible)	1	**Faible**	Utilisation exclusive de technologies et services open-source et gratuits (React, Node, MongoDB, Nominatim, Lea et).
R6	**[Périmètre]** L'équipe ne parvient pas à terminer les fonctionnalités P3 (Chat, PWA), prévues dans le dernier sprint.	2 (Moyenne)	2 (Moyen)	4	**Moyenne**	Le Scrum Master (Julien) protège l'équipe du "scope creep". Le PO (Pol) doit être prêt à sacri er ces US P3 si le MVP est en retard.

ID	Description du Risque	Probabilité (P)	Impact (I)	Criticité (P×I)	Niveau de Criticité	Actions d'atténuation
R7	**[Technique / API]** Blocahe par l'API **Nominatim** (OpenStreetMap). Elle est gratuite mais a une politique stricte d'usage (User-Agent obligatoire, limite de requêtes/seconde).	2 (Moyenne)	2 (Moyen)	4	Moyenne	Mettre un système de backup utilisant une autre API d'encodage GPS
R8	**[Données]** Hétérogénéité ou indisponibilité du service ICS de l'université (Lien cassé, format non standard, serveur EDT down).	2 (Moyenne)	3 (Élevé)	6	Élevé	Télécharger les emplois du temp sur le serveur a n de pouvoir survivre en attendant la réparation

SPRINT 1

DÉFINITIONS DES BESOINS TECHNIQUE RÉPONDANT AUX OBJECTIFS :

- CONFORT ÉTUDIANT : PWA
- TECHNOLOGIE -> SCRUM :
  - MONGODB : BASE DE DONNÉES AGILE CAR PAS DE STRUCTURE STRICTE
  - CRUD : CODE SERVEUR SÉPARÉ DU CODE WEB
  - NODEJS : PLUS FLEXIBLE ET DYNAMIQUE
  - REACT : COMPOSANT RÉUTILISABLE
- RÔLE :
  - DÉVELOPPEUR PLUS RAPIDE SUR BACKEND

FINALITÉ : CRÉATION DE LA STRUCTURE SERVEUR ET INTERFACE, SITE PERMETTANT DE SIMPLEMENT CRÉER SON COMPTE/SE CONNECTER

SPRINT 1

Tickets	Personne assignée	Rapporteur	Priorité	État	Résolution	Création	Mise à jour	Date d'échéance
~~SCRUM-10~~ Initialiser le Backend (NodeJS), le dépôt Git.	PL Pol Lamothe	JP Julien Pitré	= Medium	FAIT	Terminé	13 nov. 2025, 19:55	17 nov. 2025, 22:28	Aucun
~~SCRUM-9~~ Initialiser le Frontend (React) et définir la structure des dossiers.	KA Kyllian Arnaud	JP Julien Pitré	= Medium	FAIT	Terminé	13 nov. 2025, 19:55	26 nov. 2025, 20:48	Aucun
~~SCRUM-8~~ Mettre en place le système de routing (React Router)	KA Kyllian Arnaud	JP Julien Pitré	= Medium	FAIT	Terminé	13 nov. 2025, 19:55	13 nov. 2025, 19:56	Aucun
~~SCRUM-7~~ Créer les composants UI visuels (HTML/CSS) pour l'inscription et le login.	A Anouar	JP Julien Pitré	= Medium	FAIT	Terminé	13 nov. 2025, 19:55	26 nov. 2025, 20:48	Aucun
~~SCRUM-6~~ Implémenter la logique d'authentification (Gestion d'état global, appels API).	PL Pol Lamothe	JP Julien Pitré	= Medium	FAIT	Terminé	13 nov. 2025, 19:54	17 nov. 2025, 22:28	Aucun
~~SCRUM-5~~ Développer les endpoints d'inscription/login (avec validation email @univ-nantes.fr)	PL Pol Lamothe	JP Julien Pitré	= Medium	FAIT	Terminé	13 nov. 2025, 19:54	17 nov. 2025, 22:28	Aucun

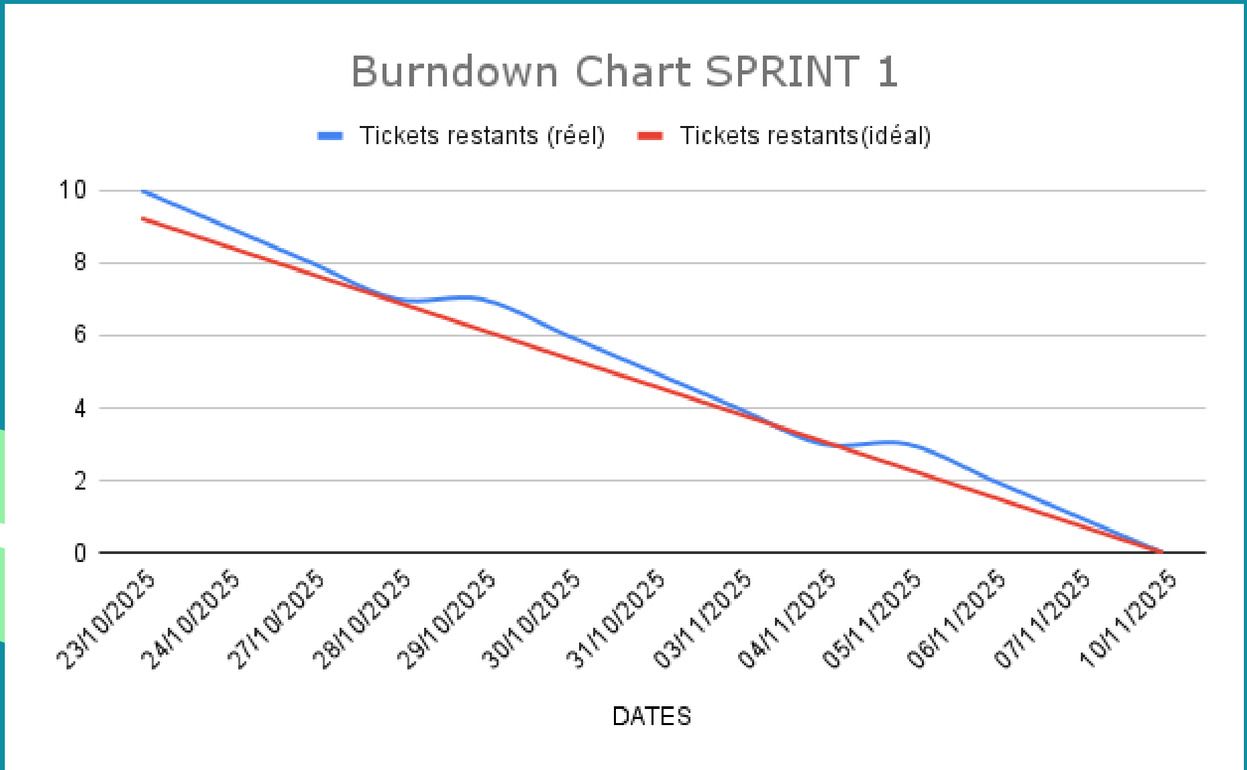

SPRINT 2

FINALITÉ : POSSIBILITÉ DE CONFIGURER SON PROFIL (LIEN CALENDRIER, ADRESSE) ET DÉPLOYER LE SITE AFIN DE COMMENCER LE RECRUTEMENT D'UTILISATEUR

DIFFICUTÉ RENCONTRÉ : PRISE EN MAIN TECHNIQUE DU FRAMEWORK DE DÉVELOPPEMENT REACT

SPRINT 2

Tickets	Personne assignée	Rapporteur	Priorité	État	Résolution	Création	Mise à jour	Date d'échéance
~~SCRUM-23~~ Déployer le site	PL Pol Lamothe	PL Pol Lamothe	Low	FAIT	Terminé	14 nov. 2025, 08:47	16 nov. 2025, 23:07	Aucun
~~SCRUM-18~~ (API) Renvoyer le contenu de l'emploi du temp d'un utilisateur	PL Pol Lamothe	PL Pol Lamothe	Low	FAIT	Terminé	14 nov. 2025, 08:40	14 nov. 2025, 08:41	Aucun
~~SCRUM-17~~ Créer la page "Emploi du temp"	KA Kyllian Arnaud	PL Pol Lamothe	Low	FAIT	Terminé	14 nov. 2025, 08:39	14 nov. 2025, 14:06	Aucun
~~SCRUM-16~~ Créer la page d'accueil.	A anouar.elkhatbiimani	JP Julien Pitré	Medium	FAIT	Terminé	13 nov. 2025, 19:59	16 nov. 2025, 22:02	Aucun
~~SCRUM-15~~ Créer la page Instagram	JP Julien Pitré	JP Julien Pitré	Medium	FAIT	Terminé	13 nov. 2025, 19:59	13 nov. 2025, 20:27	Aucun
~~SCRUM-14~~ Connecter la page "Mon Profil" à l'API.	KA Kyllian Arnaud	JP Julien Pitré	High	FAIT	Terminé	13 nov. 2025, 19:59	17 nov. 2025, 14:54	Aucun
~~SCRUM-13~~ Créer la page "Mon Profil" (Formulaire .ics + Adresse).	JP Julien Pitré	JP Julien Pitré	Highest	FAIT	Terminé	13 nov. 2025, 19:58	17 nov. 2025, 14:54	Aucun
~~SCRUM-12~~ (API) Intégrer Nominatim (géocodage de l'adresse).	PL Pol Lamothe	JP Julien Pitré	Highest	FAIT	Terminé	13 nov. 2025, 19:58	14 nov. 2025, 08:40	Aucun
~~SCRUM-11~~ (API & Logique) Développer l'endpoint et le parser (node-ical) pour l'import du lien .ics.	PL Pol Lamothe	JP Julien Pitré	Highest	FAIT	Terminé	13 nov. 2025, 19:58	14 nov. 2025, 08:40	Aucun

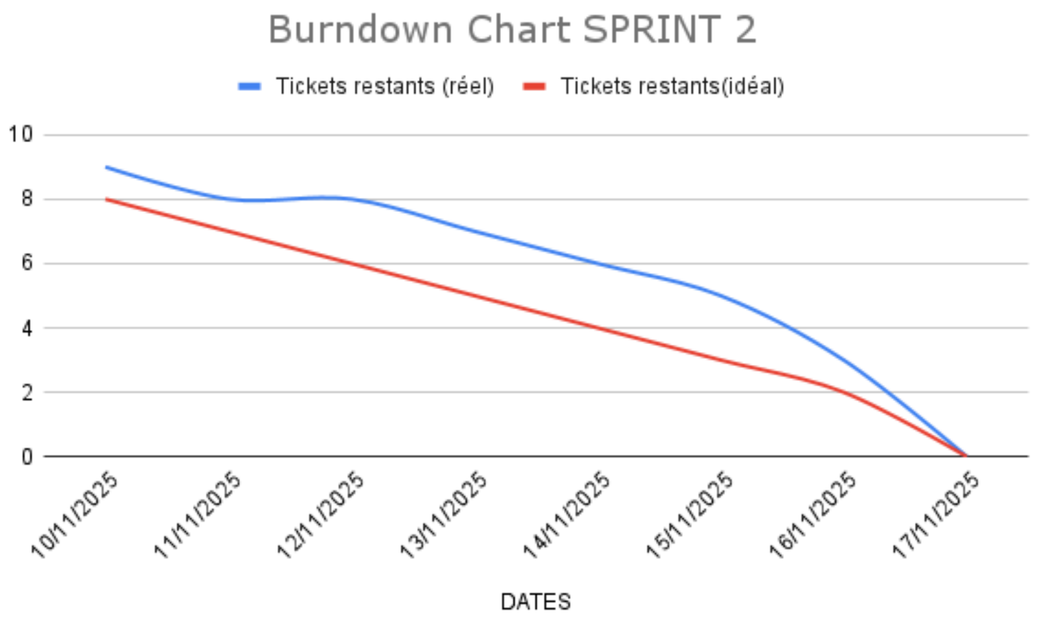

SPRINT 3

FINALITÉ : POSSIBILITÉ DE RECHERCHE UN TRAJET PAR MATCHING DES LOCALISATIONS ET EMPLOI DU TEMPS ET D'ACCEPTER/REFUSER LES DEMANDES DE TRAJETS

DIFFICULTÉS RENCONTRÉS : COORDINATIONS DE L'ÉQUIPE FRONTEND ET BACKEND SUR LES INTERACTIONS

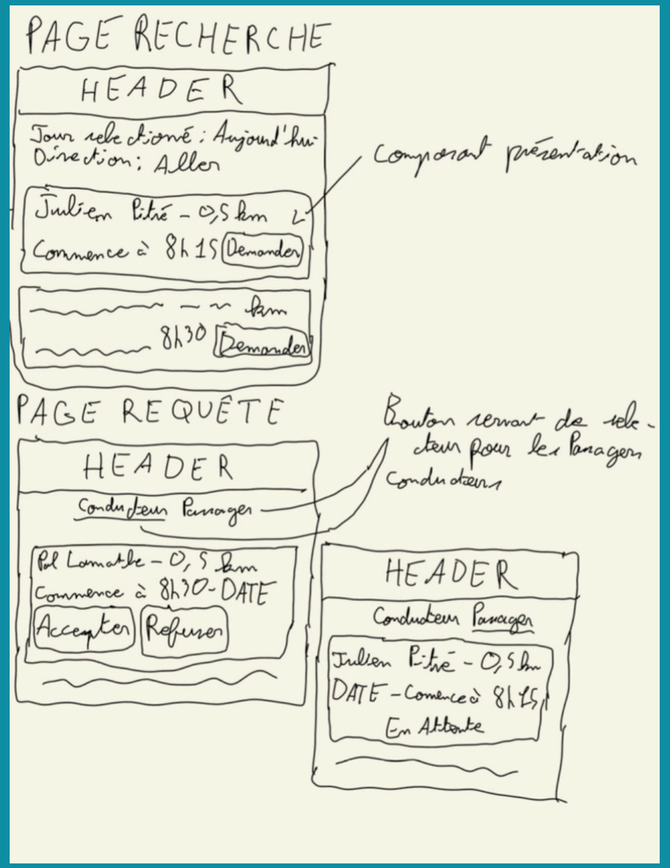

SPRINT 3

Tickets	Personne assignée	Rapporteur	Priorité	État	Résolution	Création	Mise à jour	Date d'échéance
~~SCRUM-36~~ Faire une page qui explique au gens comment trouver le lien de leur emploi du temp	JP Julien Pitré	PL Pol Lamothe	Medium	FAIT	Terminé	20 nov. 2025, 19:32	24 nov. 2025, 22:12	Aucun
~~SCRUM-35~~ Optimiser la récupération des emplois du temp	PL Pol Lamothe	PL Pol Lamothe	Medium	FAIT	Terminé	20 nov. 2025, 19:29	20 nov. 2025, 19:29	Aucun
~~SCRUM-34~~ Ajout du bouton de suppression de compte sur la page account	JP Julien Pitré	PL Pol Lamothe	Medium	FAIT	Terminé	20 nov. 2025, 09:01	23 nov. 2025, 01:05	Aucun
~~SCRUM-33~~ Créer la page de suivi des trajets et la relier avec les composants	KA Kyllian Arnaud	PL Pol Lamothe	High	FAIT	Terminé	18 nov. 2025, 09:55	25 nov. 2025, 11:56	Aucun
~~SCRUM-32~~ Créer le composant ou les passagers peuvent visualiser l'état d'une requête de trajet	PL Pol Lamothe	PL Pol Lamothe	High	FAIT	Terminé	18 nov. 2025, 09:53	24 nov. 2025, 00:01	Aucun
~~SCRUM-31~~ Créer la route permettant aux conducteurs d'accepter/refuser un trajet	PL Pol Lamothe	PL Pol Lamothe	High	FAIT	Terminé	17 nov. 2025, 22:40	19 nov. 2025, 13:56	Aucun
~~SCRUM-30~~ Créer la route permettant aux passagers de suivre leurs demandes de trajets	PL Pol Lamothe	PL Pol Lamothe	High	FAIT	Terminé	17 nov. 2025, 22:34	18 nov. 2025, 18:34	Aucun
~~SCRUM-29~~ Créer la route permettant aux utilisateurs de demander un trajet	PL Pol Lamothe	PL Pol Lamothe	High	FAIT	Terminé	17 nov. 2025, 18:40	17 nov. 2025, 19:05	Aucun
~~SCRUM-28~~ Créer la route renvoyant la liste des requêtes de covoiturage pour les conducteurs	PL Pol Lamothe	PL Pol Lamothe	High	FAIT	Terminé	17 nov. 2025, 18:39	17 nov. 2025, 18:39	Aucun
~~SCRUM-27~~ Créer la page recherche et la relier avec le composant de présentation d'un trajet	KA Kyllian Arnaud	PL Pol Lamothe	Highest	FAIT	Terminé	17 nov. 2025, 14:57	23 nov. 2025, 15:23	Aucun
~~SCRUM-26~~ Créer le composant qui propose un trajet à un conducteurs et qui lui permet de l'accepter/refuser	JP Julien Pitré	PL Pol Lamothe	High	FAIT	Terminé	17 nov. 2025, 14:54	25 nov. 2025, 11:56	Aucun
~~SCRUM-25~~ Créer le composant de présentation d'un trajet dans la liste des trajets suggéré	KA Kyllian Arnaud	PL Pol Lamothe	Highest	FAIT	Terminé	17 nov. 2025, 14:53	19 nov. 2025, 12:19	Aucun
~~SCRUM-24~~ (API & Logique) Développer l'endpoint de recherche d'un trajet (localisation & emploi du temp)	PL Pol Lamothe	PL Pol Lamothe	Medium	FAIT	Terminé	16 nov. 2025, 22:18	16 nov. 2025, 22:19	Aucun
~~SCRUM-21~~ Recruter des utilisateurs pour les tests.	A anouar.elkhatbiimani	PL Pol Lamothe	High	FAIT	Terminé	14 nov. 2025, 08:42	20 nov. 2025, 09:07	Aucun

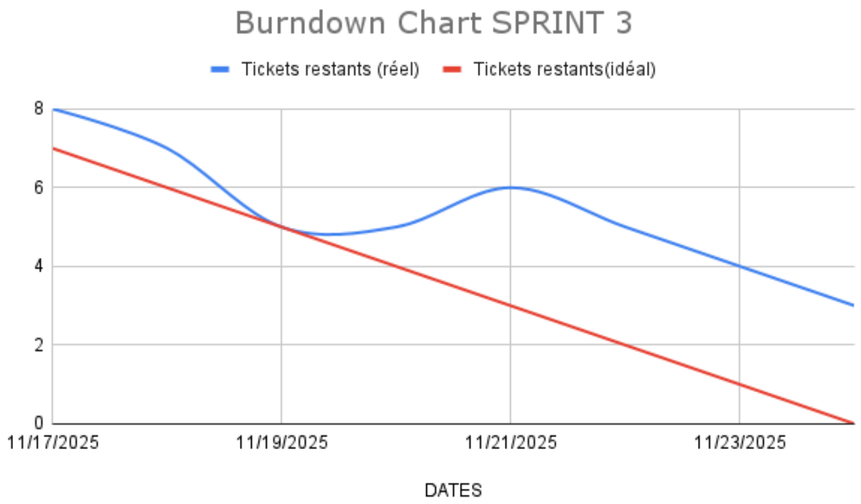

SPRINT 4

FINALITÉ : AMÉLIORER L'APPLICATION SELON LES RETOURS UTILISATEURS

PROBLÈMES RENCONTRÉS :

- UTILISATEURS NE RENSEIGNANT PAS LEURS INFORMATIONS
- UTILISATEURS RENTRANT MAL LEURS INFORMATIONS

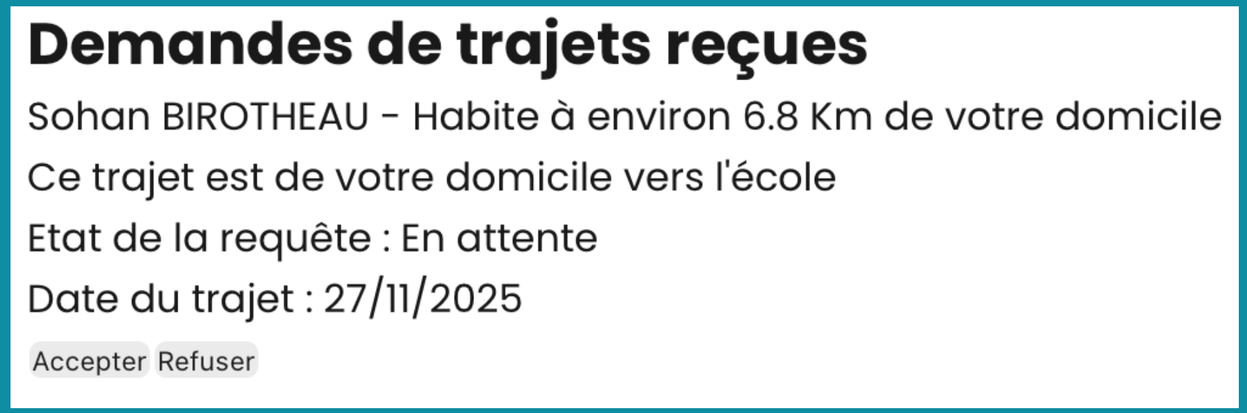

SPRINT 4

Tickets	Personne assignée	Rapporteur	Priorité	État	Résolution	Création	Mise à jour
~~SCRUM-46~~ Faire la burndown chart	Julien Pitré	Pol Lamothe	Highest	FAIT	Terminé	26 nov. 2025, 19:34	30 nov. 2025, 19:14
~~SCRUM-45~~ Si un utilisateurs fait une demande de trajet sans avoir mis son adresse il devient impossible de cons...	Pol Lamothe	Pol Lamothe	Medium	FAIT	Terminé	26 nov. 2025, 13:41	30 nov. 2025, 19:05
~~SCRUM-44~~ Faire la page à propos de nous	Kyllian Arnaud	Pol Lamothe	High	FAIT	Terminé	25 nov. 2025, 19:20	27 nov. 2025, 17:42
SCRUM-43 Faire en sorte que des utilisateurs fassent un trajet ensemble	Anouar	Pol Lamothe	Highest	EN REVUE	Non résolue	25 nov. 2025, 19:20	29 nov. 2025, 14:37
~~SCRUM-42~~ Afficher les adresses sur les trajets accepté	Pol Lamothe	Pol Lamothe	Medium	FAIT	Terminé	25 nov. 2025, 19:17	25 nov. 2025, 19:20
~~SCRUM-41~~ Permettre l'ajout d'info utilisateurs unitairement (pas tout d'un coup)	Pol Lamothe	Pol Lamothe	Medium	FAIT	Terminé	25 nov. 2025, 12:01	25 nov. 2025, 12:35
~~SCRUM-38~~ Indiquer aux utilisateurs de renseigner leurs adresse et leur emploi du temp sur la page de recherche	Pol Lamothe	Pol Lamothe	Medium	FAIT	Terminé	24 nov. 2025, 17:36	25 nov. 2025, 12:34
~~SCRUM-37~~ Empecher la création de deux même trajet similaire (bug) - FrontEnd et Backend	Pol Lamothe	Pol Lamothe	Medium	FAIT	Terminé	24 nov. 2025, 17:35	30 nov. 2025, 19:14

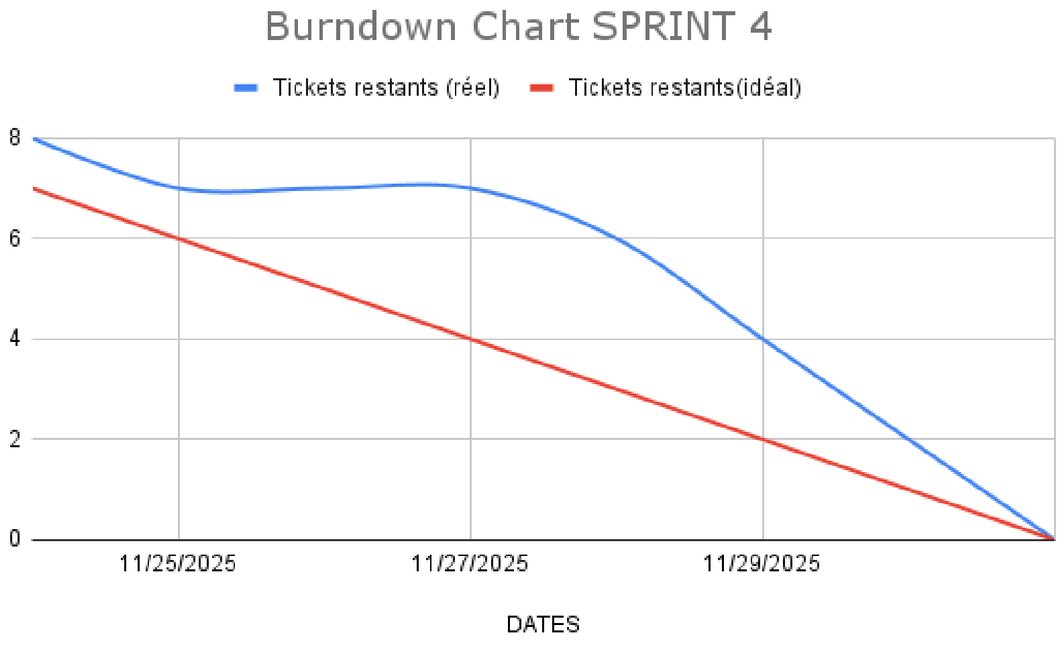

USER STORIES DU PROJET

PolyRide

PAR Julien Pitré, Pol Lamtohe, Anouar El-Khatbi, Kyllian Arnaud

2025

THÈME	EN TANT QUE....	JE VEUX...	POUR...	CRITÈRES D'APPRÉCIATION
GESTION DES INFORMATIONS	ÉLÈVE	RENSEIGNER MON ADRESSE	CALCULER AUTOMATIQUEMENT MES TRAJETS ENTRE CHEZ MOI ET POLYTECH	• L'APPLICATION ACCEPTE UNE ADRESSE VALIDE. • L'ADRESSE ENREGISTRÉE EST UTILISÉE POUR GÉNÉRER LES TRAJETS PROPOSÉS. • L'UTILISATEUR PEUT MODIFIER OU SUPPRIMER SON ADRESSE À TOUT MOMENT.
	ÉLÈVE	SYNCHRONISER MON EDT	PROPOSER AUTOMATIQUEMENT MES TRAJETS ENTRE CHEZ MOI ET POLYTECH	• L'UTILISATEUR PEUT AJOUTER SON LIEN D'EMPLOI DU TEMPS DANS L'APPLICATION. • LES TRAJETS ALLER-RETOUR SONT GÉNÉRÉS AUTOMATIQUEMENT EN FONCTION DES HORAIRES SYNCHRONISÉS.

USER STORIES DU PROJET

PolyRide

PAR Julien Pitré, Pol Lamtohe, Anouar El-Khatbi, Kyllian Arnaud

2025

THÈME	EN TANT QUE....	JE VEUX...	POUR...	CRITÈRES D'APPRÉCIATION
	ÉLÈVE	RECEVOIR DES PROPOSITIONS AUTOMATIQUES DE COVOITURAGE	RÉDUIRE MON EMPREINTE CARBONE	• LES TRAJETS PROPOSÉS APPARAISSENT AUTOMATIQUEMENT APRÈS LA SYNCHRONISATION. • LES PROPOSITIONS MONTRENT L'HEURE ET LE CONDUCTEUR • L'UTILISATEUR PEUT DONC DEMANDER UN TRAJET
GESTION DES DEMANDES DE TRAJET	PASSAGER	ENVOYER UNE DEMANDE DE TRAJET	ALLER OU REVENIR DE L'ÉCOLE	• DES PROPOSITIONS DE TRAJET SONT FAITES AUTOMATIQUEMENT • LE PASSAGER A LA POSSIBILITÉ DE SOLLICITER UN TRAJET AU CONDUCTEUR APRÈS PROPOSITION AUTOMATIQUE

USER STORIES DU PROJET

PolyRide

PAR Julien Pitré, Pol Lamtohe, Anouar El-Khatbi, Kyllian Arnaud

2025

THÈME	EN TANT QUE....	JE VEUX...	POUR...	CRITÈRES D'APPRÉCIATION
	CONDUCTEUR	ACCEPTER OU REJETER UNE PROPOSITION DE TRAJET	CHOISIR D'EMMENER OU RAMENER QUELQU'UN	• LES DEMANDES DE TRAJET DES PASSAGERS APPARAISSENT SUR L'APPLICATION • AVEC UN BOUTON ACCEPTER ET UN BOUTON REJETER, LE CONDUCTEUR PEUT GÉRER SES DEMANDES
APPORTER DES RENSEIGNMENTS	ÉLÈVE	CONNAÎTRE LES OBJECTIFS DE CE PROJET	COMPRENDRE L'UTILITÉ DE MON UTILISATION DE CETTE APPLICATION	• LA PAGE D'ACCEUIL AFFICHE DIFFÉRENS CHIFFRE SUR LES BÉNÉFICES ÉCOLOGIQUES DU VOITURAGE ET LES AMBITIONS DE CETTE APPLICATION

USER STORIES DU PROJET

PolyRide

PAR Julien Pitré, Pol Lamtohe, Anouar El-Khatbi, Kyllian Arnaud

2025

THÈME	EN TANT QUE....	JE VEUX...	POUR...	CRITÈRES D'APPRÉCIATION
	ÉLÈVE	DES AIDE POUR UTILISER L'APPLICATION	SAVOIR COMMENT RENSIGNER MES INFORMATIONS	• UNE PAGE TUTORIEL A ÉTÉ CRÉÉE POUR L'AJOUT DU LIEN DE L'EMPLOI DU TEMPS • UNE PAGE DÉDIÉE AU COMPTE ET AUX INFORMATIONS UTILISATEUR EST ACCESSIBLE FACILEMENT DEPUIS CHACUNE DES PAGES DE L'APPLICATION

BILAN DU PROJET

UTILISATEURS INSCRITS : 29

ET APRES... :

- MESSAGERIE INTÉGRÉE
- MATCHING GEOGRAPHIQUE PRENANT EN COMPTE LE TRAJET
